

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS RUBRO 266 CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES

Nº	ORDEN DE PAGO	DENOMINACION	DISTRITO	CONCEPTO	F. ORDEN DEBITO	F.F.	Nº CHEQUE	JUNIO 2026	
									MONTO
1	667	ADRIAN JAVIER ALMADA GABRIAGUEZ	ITAUGUÁ	CANCELACION DE FACTURA N° 001-001-0000443, MN-22011-25-255540, ID N° 461.248 S/RES. GDC N° 485/2026. EXP. N° 1659/2026.SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025- AD REFERENDUM	10/6/2026	30.006	DEBITO		10.000.000
2	669	ADA IDALINA TORRES CHAVEZ (SALIEC CONSULTORA)	ASUNCION	PAGO DE LA FACT. N° 001-001-0000742, MN-22011-25-262970, ID 476.592. S/ RES. GDC N° 484/2026. EXP. N° 1111/2026. SERVICIO DE AUDITORIA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS - PLURIANUAL 2025-2026.	11/6/2026	30.008	DEBITO		48.500.000
TOTAL TRANSFERIDO DEL MES: GUARANIES; CINCUENTA Y OCHO MILLOES QUINIENTOS MIL.-									58.500.000


OBS.: DATOS PROPORCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y EXTRAIDOS DEL REGISTRO MAYOR PROPORCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



JEFA DEPARTAMENTO RENDICION DE CUENTAS
C.I. N° 4.832.710



C.P. SANDRA CABRAL
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.I. N° 2.471.201



SALIEC CONSULTORA
Servicio de Asesoría Legal Impositiva y Estudio Contable
Tel. (021) 646016 -- (0981) 622134
Luque - Paraguay

Aregua, ____ de Mayo de 2026

Ramon Arce, Administrador de Contratos
Dirección General de UOC
Gobernación del Departamento Central


Presente

De mi consideración:

Me dirijo a usted en el marco del Contrato N° 55/2025 "SERVICIOS DE AUDITORÍA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PLURIANUAL 2025 - 2026", ID N° 476.562, a los efectos de remitir adjunto las Observaciones visualizadas por esta Consultora.

Estas Observaciones fueron elaboradas por el Equipo de Auditoría, conforme a los documentos proveídos por la Unidad encargada de la Administración de los Contratos dependiente de la Gobernación del Departamento Central.

Al respecto, del mismo modo se remiten las sugerencias para tener en cuenta y poder dar mejora a los puntos observados, se aclara que la evaluación fue realizada sobre los documentos provistos en cuanto a todo lo relacionado a la contratación del personal contratado en los periodos 2023, 2024 y 2025 (Contratos, Actos administrativos, reglamentaciones de contratación, archivos de concurso si los hubiere) y las recomendaciones sobre las observaciones o hallazgos de dicho periodo.


LIC. ADA TORRES CHAVEZ
CONSULTOR

SALIEC CONSULTORA


Ramon Arce
Administrador de Contratos
Gobernación Depto. Central




SALIEC CONSULTORA
Servicio de Asesoría Legal Impositiva y Estudio Contable
Tel. (021) 646916 - (0981) 622134
Luque - Paraguay


1- HALLAZGOS A LOS LEGAJOS DE RECURSOS HUMANOS

- a. Durante la evaluación del sistema control interno, realizamos consulta sobre la existencia de procesos de evaluación periódica para determinar la efectividad de las políticas y procedimientos reacionados con el desempeño de funciones de cada área.
- b. No se cuenta con procedimiento de evaluación periódica de la exactitud e integridad de la información contenida en los legajos.
- c. Faltan procedimientos formales y documentados para la solicitud y autorización de acceso a los legajos.
- d. No se dispone de un formato unificado de Currículum Vitae para los funcionarios.
- e. No se ha implementado un procedimiento formal y documentado, para la actualización de datos personales de los servidores públicos.
- f. Carencia de políticas y procedimientos relacionados con el usufructo de vacaciones.
- g. Comunicación y notificación de las sanciones disciplinarias al funcionario, de forma tardía.

2- SUGERENCIAS SOBRE LOS HALLAZGOS A LOS LEGAJOS DE RECURSOS HUMANOS

- Se recomienda a la Dirección de Talento Humano, impulsar una política que promueva la completa utilización de los días de vacaciones por el servidor público, debido a que la misma redundará en mejor desempeño y bienestar del personal
- Se recomienda establecer procedimiento relacionado a la verificación periódica de la exactitud y la integridad de la información contenida en los legajos.


SALIEC CONSULTORA



SALIEC CONSULTORA

Servicio de Asesoría Legal Impositiva y Estudio Contable

Tel. (021) 646916 - (0981) 622134

Luque - Paraguay

- Se recomienda establecer procedimientos formales y documentados para la solicitud y autorización de acceso a los legajos, incluyendo la definición de roles y responsabilidades.
- Se recomienda implementar un formato estandarizado de Curriculum Vitae para los servidores públicos, que incluyan datos y criterios relevantes para la gestión de recursos humanos; así como el periodo de actualización del mismo.
- Se recomienda establecer un proceso efectivo para la actualización periódica de datos personales por el servidor público, para asegurar la precisión y la actualidad de la información en los legajos de los servidores públicos.
- Se recomienda a la Dirección de Talento Humano diseñar e implementar una política de vacaciones para servidores públicos que asegure su utilización satisfactoria, que redunde en mejor bienestar del servidor público; y que a su vez se traduzca en un mejor desempeño.
- Se recomienda implementar un sistema informático de gestión de Talento Humano para agilizar los procesos de la Dirección de Talento Humano, mejorar la comunicación interna y cumplimiento del Reglamento Interno de la entidad, de manera a reducir la posibilidad de sanciones por falta de justificaciones o compensaciones incorrectas.

LIC. ADA I. TORREZ CHAVEZ
CONSULTOR

SALIEC CONSULTORA

INFORME DE FISCALIZACION N° 10

CONTRATO N° 11/2025

MCN ID N° 461.248

***"SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2025"***

ADRIÁN JAVIER ALMADA GABRIAGUEZ

Informe de actividades realizadas dentro del mes de mayo 2026

De conformidad y en cumplimiento a lo establecido en el PBC. Se detallan los servicios realizados en el marco del **CONTRATO N° 11/2025 MCN ID N° 461248 "SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"**

Se ha elaborado informes como respaldo documental de los certificados presentados por los contratistas para el pago correspondiente, además se ha realizado fiscalizaciones en general de todas las obras que se encuentran en ejecución, a fin de verificar el avance de las mismas. A continuación, se detallan los informes realizados en el mes de mayo/2026, los mismos se encuentran vinculados a licitaciones en ejecución y son el resultado de las verificaciones y fiscalizaciones realizadas en el marco del contrato mencionado más arriba.

Se remite adjunto los informes elaborados a los efectos de los pagos de los certificados presentados

OBRA: "REFACCION DE EX PUESTO DE SALUD ISLA GUAVIRA PARA HOGAR DE ADULTOS MAYORES - PLURIANUAL 2025-2026"

CONTRATISTA: ESTERIO CHAVES ROLON

CONTRATO: 49/2025

ID: 476.366

FONDO DE REPARO

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLES DE LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - ZONA II - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES GAEL - CRISTHIAN RAFAEL SOTELO

CONTRATO: 31/2025

ID: 475.036

CERTIFICADO N° 2 - Capiata

OBRA: "REVITALIZACION DE ESPACIOS PUBLICOS DE ESPARCIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL PLURIANUAL 2025 - 2026 CONTRATO ABIERTO"

CONTRATISTA: KAFE SOCIEDAD ANONIMA

CONTRATO: 40/2025

ID: 474.651

CERTIFICADO N° 5

OBRA: "REVITALIZACION DE ESPACIOS PUBLICOS DE ESPARCIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL PLURIANUAL 2025 - 2026 CONTRATO ABIERTO"

CONTRATISTA: KAFE SOCIEDAD ANONIMA

CONTRATO: 40/2025

ID: 474.651

CERTIFICADO N° 6

OBRA: "Mejoramiento de la Seguridad y Delimitación Territorial en los Centros Agronómicos de la Gobernación del Departamento Central mediante Cercado Perimetral - Contrato Abierto - Plurianual 2025 -2026."

CONTRATISTA: JL y Compañia SA

CONTRATO: 58/2025

Ing. *Adrian Almada*
Reg. 3813
Fiscalizador

ID: 474.249

CERTIFICADO N° 2

OBRA: "REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EMPEDRADOS CALLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA - PLURIANUAL 2025 -2026 - CONTRATO ABIERTO.

CONTRATISTA: CAÑADITA GROUP SOCIEDAD ANONIMA

CONTRATO: 27/2025

ID: 474247

CERTIFICADO N° 1 - Distrito MRA- Ypacaraí

OBRA: "Refacción de CEDEM DR. Eligio Ayala de la Ciudad de Fernando de la Mora"

CONTRATISTA: ZN Construcciones EAS

CONTRATO: 32-2025

ID: 473.920

FONDO DE REPARO

OBRA: "PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE PLAYA MUNICIPAL DE AREGUÁ- PLURIANUAL"

CONTRATISTA: ZN CONSTRUCCIONES EAS

CONTRATO: 56/2025

ID: 473.625

CERTIFICADO N° 3

OBRA: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLES DE LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - CONTRATO ABIERTO"

CONTRATISTA: MIRIAN LETICIA DOMINGUEZ GOMEZ - DOGO

CONTRATO: 24/2025

ID: 472.357

CERTIFICADO N° 3 - Distrito Luque

OBRA: "CONSTRUCCION DE CANALIZACION Y EMPEDRADO EN EL BARRIO ITAPUAMI DE LA CIUDAD DE LUQUE"

CONTRATISTA: ZN Construcciones EAS

CONTRATO: 38-2025

ID: 471.021

CERTIFICADO N° 2

OBRA: "CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL SOSTENIBLE - GDC - PLURIANUAL 2025-2026

CONTRATISTA: SPAZIO CONSTRUCCIONES SRL

CONTRATO: 08/2025

ID: 461.408

CERTIFICADO N° 3 - Convenio Modificatorio N° 2

Ing. Adrian Almada
Reg. 3813
Fiscalizador

OBRA: "CONSTRUCCION PASEAO COSTERO VIRGEN DEL CARMEN - VILLA ELISA

CONTRATISTA: SPAZIO CONSTRUCCIONES SRL

CONTRATO: 06/2025

ID: 461.046

CERTIFICADO N° 7 CONVENIO MODIFICATORIO N° 2

Ing. *Adrian Almada*
Reg. 3813
Fiscalizador

Ing. Adrian Almada

Reg.: 3813

Fiscalizador

Aregua, 22 de mayo del 2026

SEÑOR RAMON ARCE
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS
GOBERNACIÓN DPTO CENTRAL

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS CIVIL

OBRA: REFACCION DE EX PUESTO DE SALUD ISLA GUAVIRA PARA HOGAR DE ADULTOS MAYORES --
PLURIANUAL 2025-2026
CONTRATISTA: CHAVES CONSTRUCCIONES DE ESTERIO CHAVES ROLON
CONTRATO N° 49/2025
ID: 476.366

INFORME FONDO DE REPARC

Con respecto al pedido de devolución de Fondo Reparó presentado por la firma CHAVES CONSTRUCCIONES DE ESTERIO CHAVES ROLON conforme Expediente N° 1533/2026, se informa que las ordenes emitidas cuentan con las respectivas actas de recepción provisorias.

Posteriormente, luego de las verificaciones in situ realizadas se suscribió en fecha 05 de mayo de 2026 la recepción provisorio de los trabajos correspondiente a la REFACCION DE EX PUESTO DE SALUD ISLA GUAVIRA PARA HOGAR DE ADULTOS MAYORES – PLURIANUAL 2025-2026 de los siguientes certificados:

N° DE CERTIFICADO	MONTO DEL CERTIFICADO	FONDO DE REPARO
CERTIFICADO N° 1	60.237.836	3.011.892
CERTIFICADO N° 2	81.329.332	4.066.467
CERTIFICADO N° 3	107.436.554	5.371.833
CERTIFICADO N°4	15.847.117	795.356
CERTIFICADO N°5 CONVENIO MODIFICATORION°1	49.311.737	2.465.587
TOTAL FONDO DE RPARO		15.711.135

Por lo tanto, y considerando los antecedentes remitidos por la Administración para el análisis de la solicitud realizada por el Contratista, es parecer de esta Fiscalización la devolución de la retención realizada en concepto de Fondo de Reparó.

Sin otro particular, atentamente

Adrián Almada
Fiscalizador
Reg. 3813

Ramón Arce
Administrador de Contratos
Gobernación Dpto. Central

Areguá 27 de mayo de 2026

Señor
Ramon Arce, Administrador de Contratos
Gobernación del Departamento Central
Presente

INFORME DE FISCALIZACION DE OBRA CIVIL

OBRA: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLES DE LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - ZONA II - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO"
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES GAEL – CRISTIAN RAFAEL SOTELO ESTIGARRIBIA
CONTRATO: 31/2025
ID: 475.036

CERTIFICADO N° 02
Distrito de Capiata

CONSIDERACIONES GENERALES

- * EL presente trabajo de fiscalización se realizó en compañía del Representante legal de la firma CONSTRUCCIONES GAEL – CRISTIAN RAFAEL SOTELO ESTIGARRIBIA (el contratista) y el fiscal de obra el Ingeniero Adrián Almada.
- * La inspección se realizó de manera visual y realizando las mediciones correspondientes en el sitio de obra en donde se pudo observar los trabajos realizado por el contratista (fotos).

Informe Técnico Fiscal

Nos constituimos en los sitios establecidos para la ejecución de las obras para la verificación de los trabajos realizados por el contratista, entre los rubros desarrollados se encuentran: marcación, replanteo, caja de empedrado, construcción de pavimento, relleno y compactación, limpieza, entre otros, las cantidades se encuentran detalladas en el acta de medición.

Esta fiscalización manifiesta que acompañó los procesos, así también el avance físico, ha realizado verificaciones in situ, a la fecha se encuentran culminadas en los rubros mencionados en el acta de medición que se suscribe y en el que se puede observar los trabajos ejecutados por el contratista, cabe resaltar que la empresa constructora ha cumplido con las especificaciones técnicas establecidas y la calidad de los materiales utilizados para dicha obra.

Estado financiero o certificaciones realizado al contratista.

Certificado N° 01: Pagado




Certificado N° 02: En proceso

Para finalizar el presente informe de obra dejamos algunas fotos que respaldan el presente informe.


Ing. ~~Adrian Almada~~
Reg. 3813
Fiscalizador


Ramon Arce
Administrador de Contratos
Gobernación Depto Central

TRABAJOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DE CAPIATA

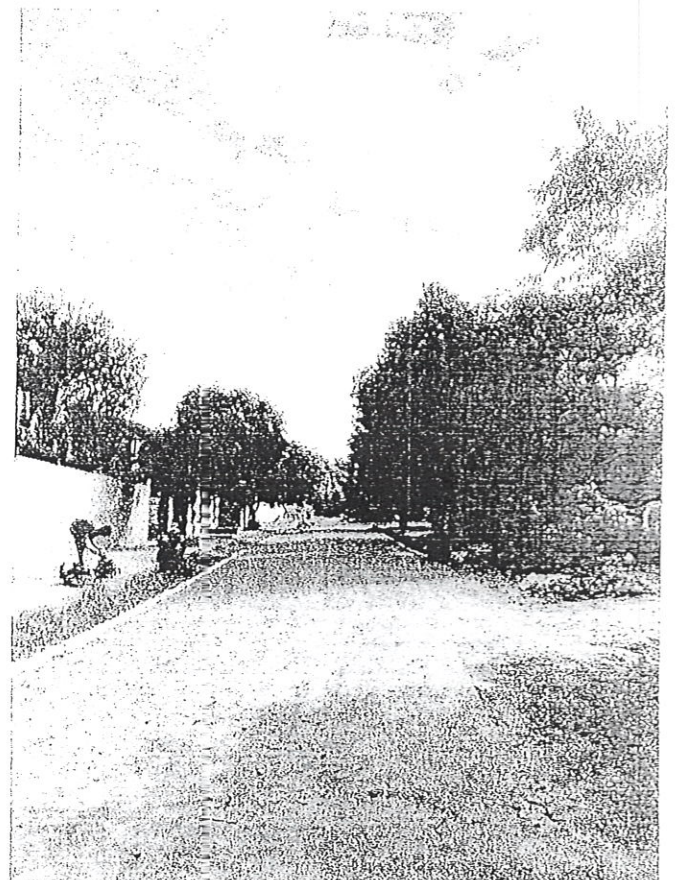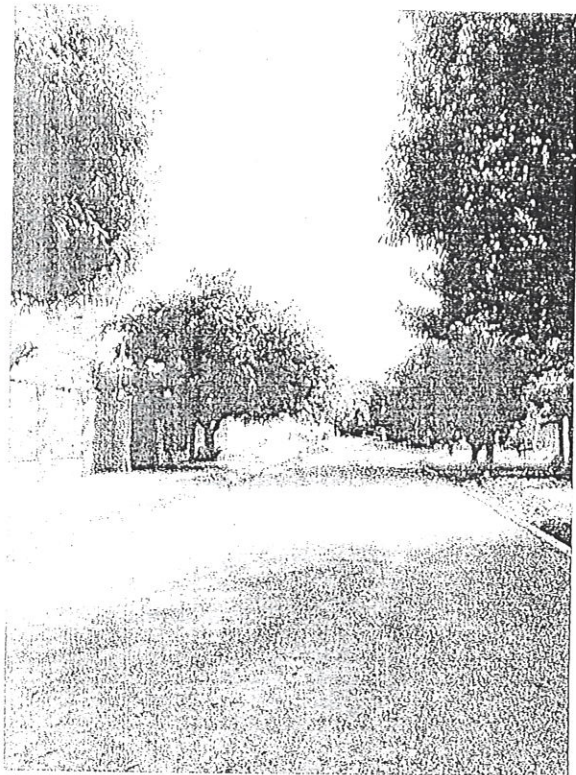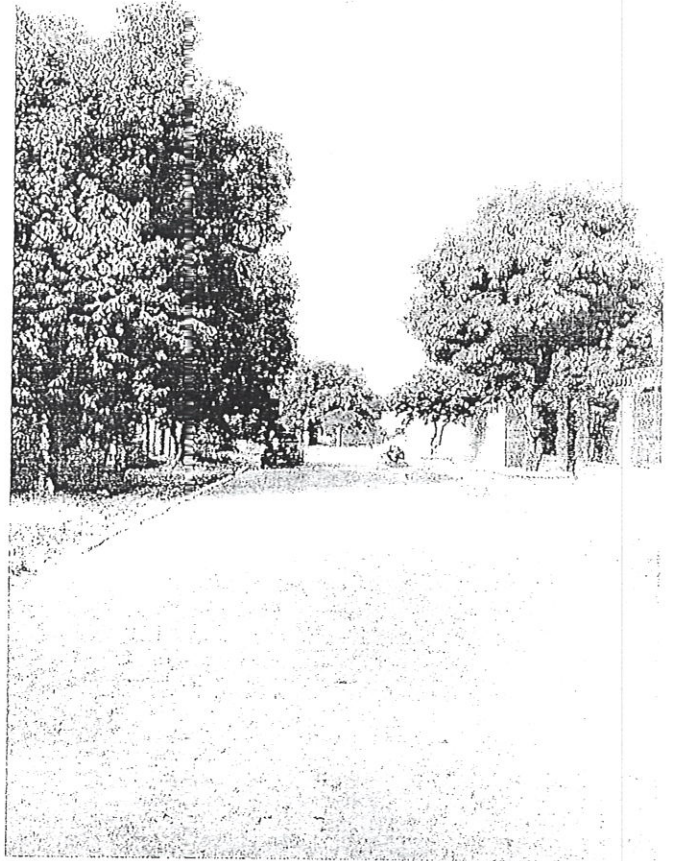

Areguá, 06 de mayo de 2026

Señor
Ramón Arce, Administrador de Contratos
Gobernación del departamento central
Presente

INFORME DE FISCALIZACION DE OBRA CIVIL

OBRA: "REVITALIZACION DE ESPACIOS PUBLICOS DE ESPARCIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL PLURIANUAL 2025 - 2026 CONTRATO ABIERTO

CONTRATISTA: KAFE S.A

CONTRATO: 40/2025

ID: 474.651

CERTIFICADO 6

CONSIDERACIONES GENERALES

- EL presente trabajo de fiscalización se realizó en compañía de Hugo Cesar Ramírez representante legal de la firma KAFE S.A (el contratista) y el fiscal de obra el Ingeniero Adrián Almada.
- La inspección se realizó de manera visual y realizando las mediciones correspondientes en el sitio de obra zona Revitalización de Espacios Publico en el Dpto. Central en donde se pudo observar los trabajos realizado por el contratista (fotos).

1.- Informe Técnico Fiscal

Nos constituimos en el sitio establecido para realizar la Fiscalización correspondiente de la ejecución de las obras para la verificación de los trabajos realizado por el contratista

Esta Fiscalización manifiesta que acompañó los procesos, así también el avance físico, ha realizado verificaciones in situ, a la fecha cuenta con avance en los rubros mencionados en el acta de medición adjunta.

Esta Fiscalización manifiesta que acompañó los procesos, así también el avance físico financiero, ha realizado verificaciones in situ en la fecha de hoy cuenta con avance en los rubros ejecutados, según el acta de medición, cabe resaltar que la empresa constructora ha cumplido con las especificaciones técnicas establecidas y la calidad de los materiales utilizados para dicha obra. (se adjunta acta de medición N°6).

-Estado financiero o certificaciones realizado al contratista.

Primer Certificado: Procesado

Segundo Certificado: Procesado

Tercer Certificado: Procesado


Cuarto Certificado: Procesado

Quinto Certificado: en Proceso

Sexto Certificado: en Proceso

De esta manera podemos verificar que el contratista ya ha realizado un avance importante de los trabajos contratados.

Para finalizar el presente informe de avance de obra se adjuntan algunas fotos que respalde el presente informe.


Ing. Adrián Almada
Fiscalizador de Obras
Reg. 3813


Ramón Arce
Administrador de Contratos
Gobernación del departamento central

Areguá, 06 de mayo de 2026

Señor
Ramón Arce, Administrador de Contratos
Gobernación del departamento central
Presente

INFORME DE FISCALIZACION DE OBRA CIVIL

OBRA: "REVITALIZACION DE ESPACIOS PUBLICOS DE ESPARCIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL PLURIANUAL 2025 - 2026 CONTRATO ABIERTO

CONTRATISTA: KAFE S.A

CONTRATO: 40/2025

ID: 474.651

CERTIFICADO 5

CONSIDERACIONES GENERALES

- EL presente trabajo de fiscalización se realizó en compañía de Hugo Cesar Ramirez representante legal de la firma KAFE S.A (el contratista) y el fiscal de obra el Ingeniero Adrián Almada.
- La inspección se realizó de manera visual y realizando las mediciones correspondientes en el sitio de obra zona Revitalización de Espacios Publico en el Dpto. Central en donde se pudo observar los trabajos realizado por el contratista (fotos).

1- Informe Técnico Fiscal

Nos constituimos en el sitio establecido para realizar la Fiscalizacion correspondiente de la ejecución de las obras para la verificación de los trabajos realizado por el contratista

Esta Fiscalización manifiesta que acompañó los procesos, así también el avance físico, ha realizado verificaciones in situ, a la fecha cuenta con avance en los rubros mencionados en el acta de medición adjunta.

Esta Fiscalización manifiesta que acompañó los procesos, así también el avance físico financiero, ha realizado verificaciones in situ en la fecha de hoy cuenta con avance en los rubros ejecutados, según el acta de medición, cabe resaltar que la empresa constructora ha cumplido con las especificaciones técnicas establecidas y la calidad de los materiales utilizados para dicha obra. (se adjunta acta de medicion N°5).

-Estado financiero o certificaciones realizado al contratista.

Primer Certificado: Procesado

Segundo Certificado: Procesado


Tercer Certificado: Procesado

Cuarto Certificado: Procesado

Quinto Certificado: en Proceso

De esta manera podemos verificar que el contratista ya ha realizado un avance importante de los trabajos contratados.

Para finalizar el presente informe de avance de obra se adjuntan algunas fotos que respalde el presente informe.


Ing. Adrián Almada
Fiscalizador de Obras
Reg. 3813


Ramón Arce
Administrador de Contratos

Areguá 06 de mayo de 2026

Ramon Arce, Administrador de Contratos
Gobernación del departamento central
Presente

INFORME DE FISCALIZACION DE OBRA CIVIL
GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD Y DELIMITACIÓN TERRITORIAL EN LOS CENTROS AGRONÓMICOS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL MEDIANTE CERCADO PERIMETRAL – CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL 2025 -2026".
CONTRATISTA: JL Y COMPAÑIA SA
CONTRATO: 58/2025
ID: 474.249

CERTIFICADO N° 2

CONSIDERACIONES GENERALES

• El presente trabajo de fiscalización se realizó en compañía de Diego Jara representante legal de la firma JL y Compañía SA. (el contratista) y el fiscal de obra el Ingeniero Adrián Almada.
• La inspección se realizó de manera visual y realizando las mediciones correspondientes en el sitio de obra zona Mejoramiento de la Seguridad y Delimitación Territorial en los Centros Agronómicos de la Gobernación del Departamento Central, en donde se pudo observar los trabajos realizados por el contratista (fotos).

1.- Informe Técnico Fiscal

Nos constituimos en el sitio de obra para la verificación de los trabajos realizado por el contratista, en donde se pudo observar que se realizaron trabajos manifestados en los rubros que se puede graficar en el acta de medición suscripta.

Esta Fiscalización manifiesta que acompaño los procesos, así también el avance físico financiero, ha realizado verificaciones in situ en la fecha de hoy cuenta con avance en los rubros ejecutados, según el acta de medición, cabe resaltar que la empresa constructora ha cumplido con las especificaciones técnicas establecidas y la calidad de los materiales utilizados para dicha obra. (se adjunta acta de medicion N° 2)


-Estado financiero o certificaciones realizado al contratista.


Primer Certificado: Pagado

Segundo Certificado: En proceso

De esta manera podemos verificar que el contratista ya ha realizado un avance importante de los trabajos contratados.

Para finalizar el presente informe de avance de obra dejamos algunas fotos que respalde el presente informe.


Ing. Adrián Almada
Fiscalizador de Obras
Reg. 3813



Areguá 27 de mayo de 2026

Señor

Ramon Arce, Administrador de Contratos

Gobernación del Departamento Central

Presente

INFORME DE FISCALIZACION DE OBRA CIVIL

OBRA: "REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EMPEDRADOS, CALLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA - PLURIANUAL 2025 -2026 - CONTRATO ABIERTO"

CONTRATISTA: CAÑADITA GROUP S.A

CONTRATO: 27/2025

ID: 474.247

CERTIFICADO N° 01

Distrito Mariano Roque Alonzo, Ypacarai

CONSIDERACIONES GENERALES

* El presente trabajo de fiscalización se realizó en compañía del Representante legal de la firma Cañadita Group S.A (el contratista) y el fiscal de obra e Ingeniero Adrián Almada.

* La inspección se realizó de manera visual y realizando las mediciones correspondientes en el sitio de obra en donde se pudo observar los trabajos realizado por el contratista (fotos)

Informe Técnico Fiscal

Nos constituimos en los sitios establecidos para la ejecución de las obras para la verificación de los trabajos realizado por el contratista, entre los rubros desarrollados se encuentran marcación replanteo, caja de empedrado, construcción de pavimento, relleno y compactación, limpieza, entre otros, las cantidades se encuentran detalladas en el acta de medición.

Esta Fiscalización manifiesta que acompañó los procesos, así también el avance físico, ha realizado verificaciones in situ, a la fecha se encuentran culminadas en los rubros mencionados en el acta de medición adjunto y en el que se puede observar los trabajos ejecutados por el contratista, cabe resaltar que la empresa constructora ha cumplido con las especificaciones técnicas establecidas y la calidad de los materiales utilizados para dicha obra.

Estado financiero o certificaciones realizado al contratista.

Pago Certificado N° 01: En proceso.

Para finalizar el presente informe de obra dejamos algunas fotos que respaldan el presente informe.

Ing. Adrián Almada
Reg. 3813
Fiscalizador

113
Ramon Arce
Administrador de Contratos
Gobernación del Departamento Central

ACTA DE MEDICION N° 1

LPN REPARACION Y MEJORAMIENTO DE EMPEDRADOS,CALLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA -CN° 27/2025- ID N° 474.247						
EMPRESA: CAÑADITA GROUP SOCIEDAD ANONIMA						
FISCAL DE OBRA: Ing. Adrian Almada						
OBRA:REPARACION Y MEJORAMIENTO DE EMPEDRADOS,CALLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA						
CONTRATO N° 27/2025				CANTIDADES		
N°	CALLE/TRAMO	UNIDAD	CANTIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
	CALLE PRESIDENTE HAYES- MARIANO ROQUE ALONSO					
1	Cartel de Obra	un	1,00		1,00	1,00
2	Relleno y compactacion	m3	375,00		375,00	375,00
3	Provision e piedras brutas	un	7,00		7,00	7,00
4	Provision de arena lavada 6m3	un	12,00		12,00	12,00
5	Compactacion mecanica	m2	3.850,00		3.850,00	3.850,00
6	Reparacion de empedrado	m2	3.850,00		3.850,00	3.850,00
7	Limpieza final	un	1,00		1,00	1,00
N°	CALLE C. YEGROS - YPACARAI	UNIDAD	CANTIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
1	Relleno y compactacion	m3	21,00		21,00	21,00
2	Provision e piedras brutas	un	1,00		1,00	1,00
3	Provision de arena lavada 6m3	un	2,00		2,00	2,00
4	Compactacion mecanica	m2	140,00		140,00	140,00
5	Reparacion de empedrado	m2	140,00		140,00	140,00
6	Limpieza final	un	1,00		1,00	1,00
CONTRATO N° 27/2025						
N°	CALLE ALBERDI - YPACARAI	UNIDAD	CANTIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
1	Relleno y compactacion	m3	16,92		16,92	16,92
2	Provision e piedras brutas	un	1,00		1,00	1,00
3	Provision de arena lavada 6m3	un	2,00		2,00	2,00
4	Compactacion mecanica	m2	94,00		94,00	94,00
5	Reparacion de empedrado	m2	94,00		94,00	94,00
6	Limpieza final	un	1,00		1,00	1,00
CONTRATO N° 27/2025						
N°	CALLE ACOSTA ÑU - YPACARAI	UNIDAD	CANTIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
1	Cartel de Obra	un	1,00			
2	Relleno y compactacion	m3	74,60		74,60	74,60
3	Provision e piedras brutas	un	3,00		3,00	3,00
4	Provision de arena lavada 6m3	un	4,00		4,00	4,00
5	Compactacion mecanica	m2	373,00		373,00	373,00
6	Reparacion de empedrado	m2	373,00		373,00	373,00

Ing. Adrian Almada
Reg. 3813
Fiscalizador

7	Limpieza final	un	1,00		1,00	1,00
CONTRATO N° 27/2025						
N°	CALLE AQUIDABAN - YPACARAI	UNIDAD	CANTIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
1	Cartel de Obra	un	1,00			
2	Relleno y compactacion	m3	113,20		103,20	103,20
3	Provision e piedras brutas	un	4,00		4,00	4,00
4	Provision de arena lavada 6m3	un	6,00		6,00	6,00
5	Compactacion mecanica	m2	516,00		516,00	516,00
6	Reparacion de empedrado	m2	516,00		516,00	516,00
7	Limpieza final	un	1,00		1,00	1,00
CONTRATO N° 27/2025						
N°	CALLE JULIO CORREA - YPACARAI	UNIDAD	CANTIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
1	Relleno y compactacion	m3	43,38		43,38	43,38
2	Provision e piedras brutas	un	4,00		4,00	4,00
3	Provision de arena lavada 6m3	un	4,00		4,00	4,00
4	Compactacion mecanica	m2	241,00		241,00	241,00
5	Reparacion de empedrado	m2	241,00		241,00	241,00
6	Limpieza final	un	1,00		1,00	1,00

Para finalizar el presente informe de obra dejamos algunas fctos que respaldan el presente informe.

Ing. Adrian Almada
Reg. 3813
Fiscalizador

Ing.: Adrian Almada
Reg.: 3813
Fiscalizador

Ing. Adrian Almada
Reg. 3813
Fiscalizador

Aregua, 11 de mayo del 2026

SEÑOR RAMON ARCE
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS
GOBERNACIÓN DPTO CENTRAL

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS CIVIL

OBRA: REFACCION DE CEDM DR. ELIGIO AYALA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA
CONTRATISTA: ZN CONSTRUCCIONES EAS UNIPERSONAL
CONTRATO N° 31/2025
ID: 473.920

INFORME FONDO DE REPARO

Con respecto al pedido de devolución de Fondo Reparó presentado por la firma ZN CONSTRUCCIONES EAS UNIPERSONAL conforme Expediente N° 1412/2026, se informa que las ordenes emitidas cuentan con las respectivas actas de recepción provisionarias.

Posteriormente, luego de las verificaciones in situ realizadas se suscribió en fecha 29 de enero de 2026 la recepción definitiva de los trabajos correspondiente a la REFACCION DE CEDM DR. ELIGIO AYALA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA de los siguientes certificados:

N° DE CERTIFICADO	MONTO DEL CERTIFICADO	FONDO DE REPARO
Certificado 1	258.417.190	12.920.860
Certificado 2	270.106.469	13.505.323
Certificado 3	15.298.935	764.947
TOTAL FONDO DE RPARO		27.191.130

Por lo tanto, y considerando los antecedentes remitidos por la Administración para el análisis de la solicitud realizada por el Contratista, es parecer de esta Fiscalización la devolución de la retención realizada en concepto de Fondo de Reparó.

Sin otro particular, atentamente

Ing. Ing. Adrián Almada
Reg. 3813
Fiscalizador

Adm. L. P. de Obras Públicas
Gobernación Dpto. Central

Areguá, 18 de mayo de 2026

Lic. Arce Ramón,
Administrador Contrato
Gobernación del departamento central
Presente

INFORME DE FISCALIZACION DE OBRA C VII
GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

OBRA: LPN "Proyecto de Reacondicionamiento de Infraestructura de Playa Municipal de Areguá-
Plurianual"
CONTRATISTA: ZN CONSTRUCCIONES EAS UNIPERSONAL
CONTRATO: N° 56/2025
ID: 473.625

CERTIFICADO N° 3

CONSIDERACIONES GENERALES

* El presente trabajo de fiscalización se realizó en compañía del Arq. Nelson Ramón Villarta Saucedo representante legal de la firma ZN CONSTRUCCIONES EAS UNIPERSONAL (el contratista) y el fiscal de obra el ingeniero Adrián Almada.

* La inspección se realizó de manera visual y realizando las mediciones correspondientes en el sitio de obra zona Reacondicionamiento de Infraestructura de Playa Municipal de Areguá, en donde se pudo observar los trabajos realizados por el contratista (fotos).

Informe Técnico Fiscal

* Nos constituimos en el sitio de obra para la verificación de los trabajos realizado por el contratista, en donde se pudo observar que se realizaron trabajos reparaciones de pisos, reparación de muelle peatonal, reposición de alumbrado, tipo alumbrado, tortuga, bidireccional y reflectores, reparación y tratamiento de puentes de madera, tratamientos de pérgolas mecánicas, entre otros trabajos que se puede graficar en el acta de medición y en las evidencias fotográficas.

* Las cantidades verificadas al momento de la fiscalización fueron detalladas en el acta de medición y concuerdan con las cantidades ejecutadas y verificadas en el certificado presentado por el contratista, en prueba de conformidad estos documentos fueron suscriptos por esta fiscalización

* La fiscalización manifiesta que acompaño los procesos, así también el avance físico financiero, ha realizado verificaciones in situ, y a la fecha cuenta con avance en los rubros ejecutados, según el acta de medición y en el que se puede observar el avance porcentual de los trabajos ejecutados por el contratista, cabe resaltar que la empresa constructora ha cumplido con las especificaciones técnicas establecidas y la calidad de los materiales utilizados para dicha obra.

Estado financiero de certificaciones realizadas al contratista.

Certificado N° 1: pagado

Certificado N° 2: pagado

Certificado N° 3: en proceso

Por lo que se sugiere el pago del Certificado N° 03, salvo mejor parecer.

Se adjunta:

Archivo fotográfico

Acta de medición

Este informe

Adrián Almada
Reg. 3813
Fiscalizador

Ramón Arce
Administrador de Contratos
Gobernación Dpto. Cent.

Areguá 27 de mayo de 2026

Señor
Ramón Arce, Administrador de Contratos
Gobernación del Departamento Central
Presente

INFORME DE FISCALIZACION DE OBRA CIVIL

OBRA: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLES DE LOS DISTRITOS DEL
DEPARTAMENTO CENTRAL - CONTRATO ABIERTO"
CONTRATISTA: MIRIAN LETICIA DOMINGEZ GOMEZ - DOGO
CONTRATO: 24/2025
ID: 472357

CERTIFICADO N° 03
Distrito Luque

CONSIDERACIONES GENERALES

- EL presente trabajo de fiscalización se realizó en compañía del Representante legal de la firma DOGO (el contratista) y el fiscal de obra el Ingeniero Adrián Almada.
- La inspección se realizó de manera visual y realizando las mediciones correspondientes en el sitio de obra en donde se pudo observar los trabajos realizado por el contratista (fotos).

Informe Técnico Fiscal

Nos constituimos en los sitios establecidos para la ejecución de las obras para la verificación de los trabajos realizado por el contratista, entre los rubros desarrollados se encuentran marcación replanteo, caja de empedrado, construcción de pavimento, relleno y compactación, limpieza, entre otros, las cantidades se encuentran detalladas en el acta de medicion.


Esta Fiscalización manifiesta que acompañó los procesos, así también el avance físico, ha realizado verificaciones in situ, a la fecha cuenta con avance en los rubros mencionados en el acta de medición que se suscribe y en el que se puede observar el avance porcentual los trabajos ejecutados por el contratista, **cabe resaltar** que la empresa constructora ha cumplido con las especificaciones técnicas establecidas y la calidad de los materiales utilizados para dicha obra.

Estado financiero o certificaciones realizado al contratista.

Pago Certificado N° 01: pagado.

Pago Certificado N° 02: pagado.


Pago Certificado N° 03: en proceso


Ing. Adrián Almada
Fiscalizador




Para finalizar el presente informe de avance de obra dejamos algunas fotos que respaldan el presente informe.


CAÑADA SAN RAFAEL – LUQUE

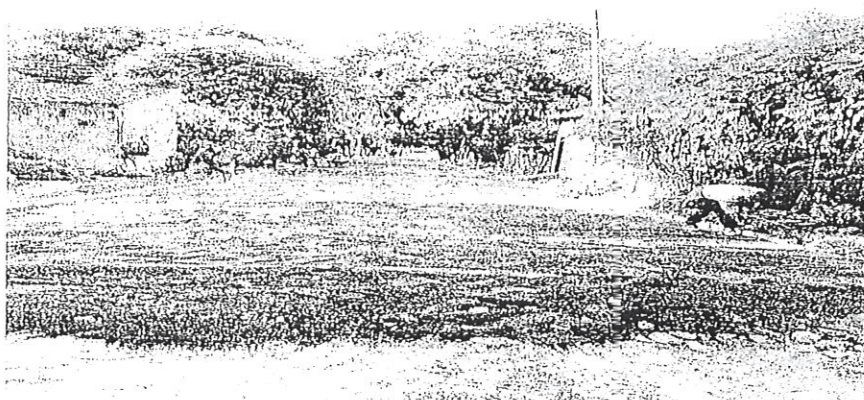

LAURELTY - LUQUE

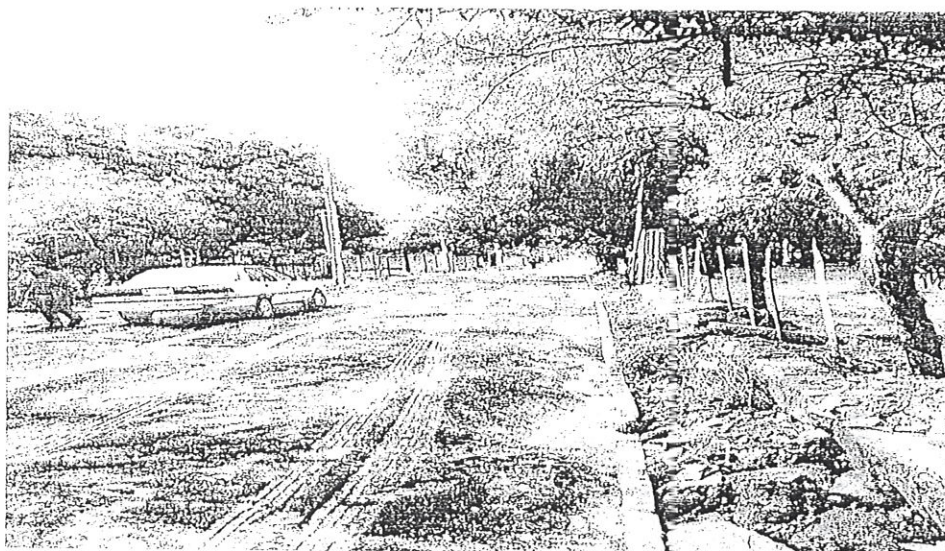

Ing. Adrián Almada
Reg. 3873
Fiscalizador



Areguá 18 de mayo de 2026

Señor
Ramón Arce, Administrador de Contratos
Gobernación del Departamento Central
Presente

INFORME DE FISCALIZACION DE OBRA CIVIL

OBRA: "CONSTRUCCION DE CANALIZACION Y EMPEDRADO EN EL BARRIO ITAPUAMI DE LA CIUDAD DE LUQUE"

CONTRATISTA: ZN CONSTRUCCIONES EAS UNIPERSONAL

CONTRATO: 38/2025

ID: 471.021

CERTIFICADO N° 02

CONSIDERACIONES GENERALES

* EL presente trabajo de fiscalización se realizó en compañía de Nelson Villarta representante legal de la firma ZN CONSTRUCCIONES EAS UNIPERSONAL (el contratista) y el fiscal de obra el Ingeniero Adrián Almada.

* La inspección se realizó de manera visual y realizando las mediciones correspondientes en el sitio de obra CONSTRUCCION DE CANALIZACION Y EMPEDRADO EN EL BARRIO ITAPUAMI DE LA CIUDAD DE LUQUE en donde se pudo observar los trabajos realizados por el contratista (fotos).

Informe Técnico Fiscal

Nos constituimos en el sitio establecido para la ejecución de la obra para la verificación del trabajo realizado por el contratista, entre los rubros desarrollados se encuentran demolición de piso, reposición de piso, reparaciones varias entre otros rubros de las refacciones que se pueden graficar en el acta de medición.


Esta Fiscalización manifiesta que acompañó los procesos, así también el avance físico, ha realizado verificaciones in situ, a la fecha cuenta con avance en los rubros mencionados en el acta de medición adjunto y en el que se puede observar el avance porcentual los trabajos ejecutados por el contratista, cabe resaltar que la empresa constructora ha cumplido con las especificaciones técnicas establecidas y la calidad de los materiales utilizados para dicha obra.

Estado financiero o certificaciones realizado al contratista.

Pago Certificado N° 01: pagado

Pago Certificado N° 02: en proceso

Para finalizar el presente informe de avance de obra dejamos algunas fotos que respaldan el presente informe.


Ing. Adrián Almada
Reg. 3813
Fiscalizador


Nelson Villarta
Representante Legal
Reg. 3813

Areguá 20 de mayo de 2026

Sr. Ramon Arce
Administrador de contrato
Gobernación del departamento central
Presente

INFORME DE FISCALIZACION DE OBRA CIVIL
GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

OBRA: "CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL SOSTENIBLE - GDC
PLURIANUAL 2025-2026
CONTRATISTA: SPAZIO CONSTRUCCIONES SRL
CONTRATO: 08/2025
ID: 461.408

CERTIFICADO N° 3- Convenio Modificatorio N° 2

CONSIDERACIONES GENERALES

- EL presente trabajo de fiscalización se realizó en compañía del Ingeniero Marcelo Penayo representante legal de la firma Spazio Construcciones SRL (el contratista) y el fiscal de obra el Ingeniero Adrián Almada.
- La inspección se realizó de manera visual en el sitio de obra zona **PARQUE CENTRAL SOSTENIBLE** en la ciudad de Areguá, en donde se pudo observar los trabajos realizado por el contratista (fotos).

1- Informe Técnico Fiscal

Nos constituimos en el sitio de obra para la verificación de los trabajos realizado por el contratista, donde se observa la ejecución parcial de los rubros establecidos en el Convenio Modificatorio N° 2 y considerando los criterios constructivos según las especificaciones técnicas.

La obra se encuentra con una ejecución de 60,069% de los rubros descriptos en la planilla de Convenio Modificatorio N° 2. Entre los rubros presentados en la presente certificación se encuentran, Desbroce y Limpieza del terreno. Incluye retiro, Sistema de drenaje subterráneo con caños de pvc perforados de 200 y 100 y malla geotextil. Incluye excavacion y base de Piedra triturada Según plano, Perforacion de pozo artesiano para captacion de agua, con bomba sumergible; los trabajos se realizan con maquinarias pesada y mano de obra manual en coordinación, bajo la supervisión del residente de obra.

Las cantidades verificadas al momento de la fiscalización fueron detalladas en el acta de medicion y concuerdan con las cantidades ejecutadas y verificadas en el certificado presentado por el contratista, en prueba de conformidad estos documentos fueron suscriptos por esta fiscalización.

Esta Fiscalización manifiesta que acompañó los procesos, así también el avance físico, ha realizado verificaciones in situ, a la fecha cuenta con avance en los rubros

SEPTIEMBRE CERTIFICADO N° 3- CONVENIO MODIFICATORIO N° 2

Fig. 10/10/2026
RPM: 3813
M. Almada

1

mencionados en el acta de medición y en el que se puede observar el avance porcentual los rubros ejecutados por el contratista, , cabe resaltar que la empresa constructora ha cumplido con las especificaciones técnicas establecidas y la calidad de los materiales utilizados para dicha obra.

El archivo fotográfico se presenta adjunto en el expediente 1234/2026

Estado financiero de certificaciones realizadas al contratista.

Certificado N° 1: pagado

Certificado N° 2: pagado

Certificado N° 3 Convenio Modificatorio N° 2: en proceso

Por lo que se sugiere el pago del Certificado N° 3 - Convenio Modificatorio N° 2.

Se adjunta:

Acta de medicion Certificado N° 3 Convenio Modificatoric N° 2

Es mi informe


Ing. Adrian Almagor
Reg.: 3813
Fiscalizador


Ramón A. ...
Administrador de ...
Código ...
RECIBIDO
22/05/2026

Acta de medición

ACTA DE MEDICION - CERTIFICADO 3 - CONVENIO MODIFICATORIO N° 2									
CONVENIO MODIFICATORIO N° 2 AL CONTRATO 08/2025 ID 461488									
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Acumulado anterior	Ejecutado en el periodo	Acumulado actual
36	72131601-002	Obras Preliminares	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00		341.240.000			340.840.000
		Desbroce y limpieza del terreno. Incluye retiro	metros cuadrados	85210	4.000	341.240.000		85210	340.840.000
37	72131601-9986	Cancha de Fútbol	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00		244.372.000		0	95.000.000
		Sistema de drenaje subterráneo con caños de pvc perforados de 200 y 100 y malla geotextil. Incluye excavación y base de piedra triturada. Según plano	metros cuadrados	9.458,00	19.000	179.702.000		5000	95.000.000
		Registro pluvial abierto 50x50	unidad	22,00	485.000	10.670.000			0
		Cañería de pvc de 200, para desagüe pluvial	Metro lineal	300,00	180.000	54.000.000			0
38	72131601-001	Instalaciones Eléctricas	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00		76.563.000		0	
		Protección mecánica para electroductos subterráneos, prof: 70cm. Incluye excavación, arena lavada y ladrillos.	metros lineales	1.800,00	25.000	45.000.000			0
									0,000%
									0,000%
									0,000%
									0,000%

[Firma]

	Electrodutos subterráneos	metros lineales	1.753,50	18.000	31.563.000				0	0,000%
39	72101510 -002 Instalación Hidráulica	unidad de medida: Global presentación: UNIDAD	1,00		198.025.000				0	80.872.334
	Perforación de pozo artesiano para captación de agua, con bomba sumergible	unidad	1,00	80.872.334	80.872.334				1	80.872.334
	Provision y colocacion e instalacion de tanque para agua de 30.000 litros	unidad	1,00	65.000.000	65.000.000				0	0,000%
	Instalación completa y puesta en funcionamiento de sistema de riego, con cañerías, aspersores y accesorios.	unidad	1,00	52.159.367	52.152.666				0	0,000%
		Total por Grupo:			860.200.000					516.712.334

Ing. ~~Roberto Almada~~
R033813
Fiscalizador

Areguá 7 de mayo de 2026

Sr. Ramon Arce
Administrador de contrato
Gobernación del departamento central
Presente

INFORME DE FISCALIZACION DE OBRA CIVIL
GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

OBRA: "CONSTRUCCION PASEO COSTERO VIRGEN DEL CARMEN – VILLA ELISA
CONTRATISTA: SPAZIO CONSTRUCCIONES SRL
CONTRATO: 06/2025
ID: 461.046

CERTIFICADO N° 7 CONVENIO MODIFICATORIO N°2

CONSIDERACIONES GENERALES

- El presente trabajo de fiscalización se realizó en compañía del Ingeniero Marcelo Penayo representante legal de la firma Spazio Construcciones SRL (el contratista) y el fiscal de obra el Ingeniero Adrián Almada.
- La inspección se realizó de manera visual en el sitio de obra zcna Paseo costero Virgen del Carmen ciudad de Villa Elisa, en donde se pudo observar los trabajos realizado por el contratista (fotos).

1. Informe Técnico Fiscal

Nos constituimos en el sitio de obra para la verificación de los trabajos realizado por el contratista, donde se observa la ejecución total según los rubros establecidos en el Convenio Modificatorio N° 2 y considerando los criterios constructivos según las especificaciones técnicas.

La obra se encuentra con una ejecución de 100% de los rubros descriptos en la planilla de Convenio Modificatorio N° 2. Entre los rubros presentados en la presente certificación se encuentran, colchones reno y refulado de arena; los trabajos se realizan con maquinarias pesada y mano de obra manual en coordinación, bajo la supervisión del residente de obra.

Las cantidades verificadas al momento de la fiscalización fueron detalladas en el acta de medición y concuerdan con las cantidades ejecutadas y verificadas en el certificado presentado por el contratista, en prueba de conformidad estos documentos fueron suscriptos por esta fiscalización.

Esta Fiscalización manifiesta que acompañó los procesos, así también el avance físico, ha realizado verificaciones in situ, a la fecha cuenta con avance en los rubros mencionados en el acta de medición y en el que se puede observar el avance porcentual los trabajos ejecutados por el contratista, llegando al 100 % de la ejecución, cabe resaltar que la empresa constructora ha cumplido con las especificaciones técnicas establecidas y la calidad de los materiales utilizados para dicha obra.

Estado financiero de certificaciones realizadas al contratista.

Certificado N° 1: pagado

Certificado N° 2: pagado

Certificado N° 3: pagado

Certificado N° 4: pagado

Certificado N° 5: pagado

Certificado N° 6: pagado

• Certificado N° 7 Convenio Modificatorio N° 2: en proceso.


Fiscal de Obra
Ingeniero Adrián Almada

Por lo que se sugiere el pago del Certificado N° 07 – Convenio Modificadorio N° 2, salvo mejor parecer.

Se adjunta:

Archivo fotográfico

Acta de medicion N° 7 – Convenio Modificadorio N° 2

Así mi informe


Ing. Adrian Almada
Reg.: 3813
Fiscalizador


Ramón Arco
Administrador de Combate
Comando en Jefe

Licitación: 461046 - Construcción Paseo Costero Virgen del Carmen - Villa El sa - PLURIANUAL 2025-2026						
ACTA DE MEDICIÓN N° 7 SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO N° 2						
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	CANTIDADES		
				Acumulado anterior	Ejecutado en el periodo	Acumulado actual
1	Trabajos Preliminares	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-	-	-
	ESTUDIO DE SUELO	Unidad Medida Global	1,00	1,0	-	1,0
	TOPOGRAFIA - COTAS - RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO	Unidad Medida Global	1,00	1,0	-	1,0
	BATIMETRÍA	Unidad Medida Global	1,00	1,0	-	1,0
	OBRA	Unidad Medida Global	1,00	1,0	-	1,0
	DESARROLLO DE PROYECTO	Unidad Medida Global	1,00	1,0	-	1,0
2	Preparacion de obra	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-	-	-
	LIMPIEZA DE TERRENO - DESBROCE	metros cuadrados	16.860,00	16.860,0	-	16.860,0
	REPLANTIO Y MARCACION	metros cuadrados	16.860,00	16.860,0	-	16.860,0
	VALLADO DE OBRA	Metro lineal	570,00	570,0	-	570,0
	RELLENO Y COMPACTACION	metros cubicos	5.000,00	5.000,0	-	5.000,0
	CARTEL IDENTIFICATORIO	unidad	1,00	1,0	-	1,0
	DESARMADO DE VALLADO DE OBRA	Metro lineal	570,00	570,0	-	570,0
		unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	1,00	-	-	-
3	Excavaciones	presentación: UNIDAD	1,00	-	-	-
	EXCAVACIONES EN GENERAL	metros cubicos	8.295,90	8.295,9	-	8.295,9
4	MURO DE CONTENCION Y GUASDACOSTERA	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-	-	-
	MEJORAMIENTO DE LA BASE CON DESTAPE DE CANTERA	metros cubicos	2.155,00	2.155,0	-	2.155,0
	REGULARIZACION MANUAL DE BASE EN SUELO	metros cuadrados	676,80	676,8	-	676,8
	PEDRAPLEN	metros cubicos	343,00	343,0	-	343,0
	ENROCADO	metros cubicos	676,80	676,8	-	676,8
	CONTRAFUERTE DE GAVIONES	metros cubicos	153,00	153,0	-	153,0
	COLOCACION DE GAVIONES	metros cubicos	4.137,00	4.137,0	-	4.137,0
	COLCHONES RENO	metros cuadrados	358,00	286,0	112,0	398,0
	GEOTEXTIL NO TEJIDO 200 G/M2	metros cuadrados	6.768,00	6.768,0	-	6.768,0
	COMPACTACION	metros cuadrados	16.860,00	16.860,0	-	16.860,0
	PLERFIADO	metros cuadrados	16.860,00	16.860,0	-	16.860,0
		unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	1,00	-	-	-
	REFULADO DE ARENA LAVADA	metros cubicos	97.540,00	81.540,0	16.000,0	97.540,0
		unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1,00	-	-	-
	LIMPIEZA DIARIA, PERIODICA Y FINAL DE OBRA	metros cuadrados	16.860,00	16.860,0	-	16.860,0

